セルフカフェ株式会社

WIFI・電源完備の無人カフェ
セルフカフェ

PROJECT KICK-OFF

未来屋書店 秋田店　カフェ区画 業態転換

スケジュールとご確認事項

2027 年 2 月末のオープンに向けた工程と、事前にご確認・ご準備いただきたい事項を整理しました。工期の目安と、仕様確定・発注の期限もあわせてご覧ください。

2027 年 2 月末
オープン目標


3 〜 4 週間
閉店後の工事期間

12 月上旬
仕様確定・発注の期限

01　スケジュール案

2 月末オープンは、十分に可能です。

ご希望の「 1 月末クリエ閉店・ 2 月末オープン」から逆算した工程です。

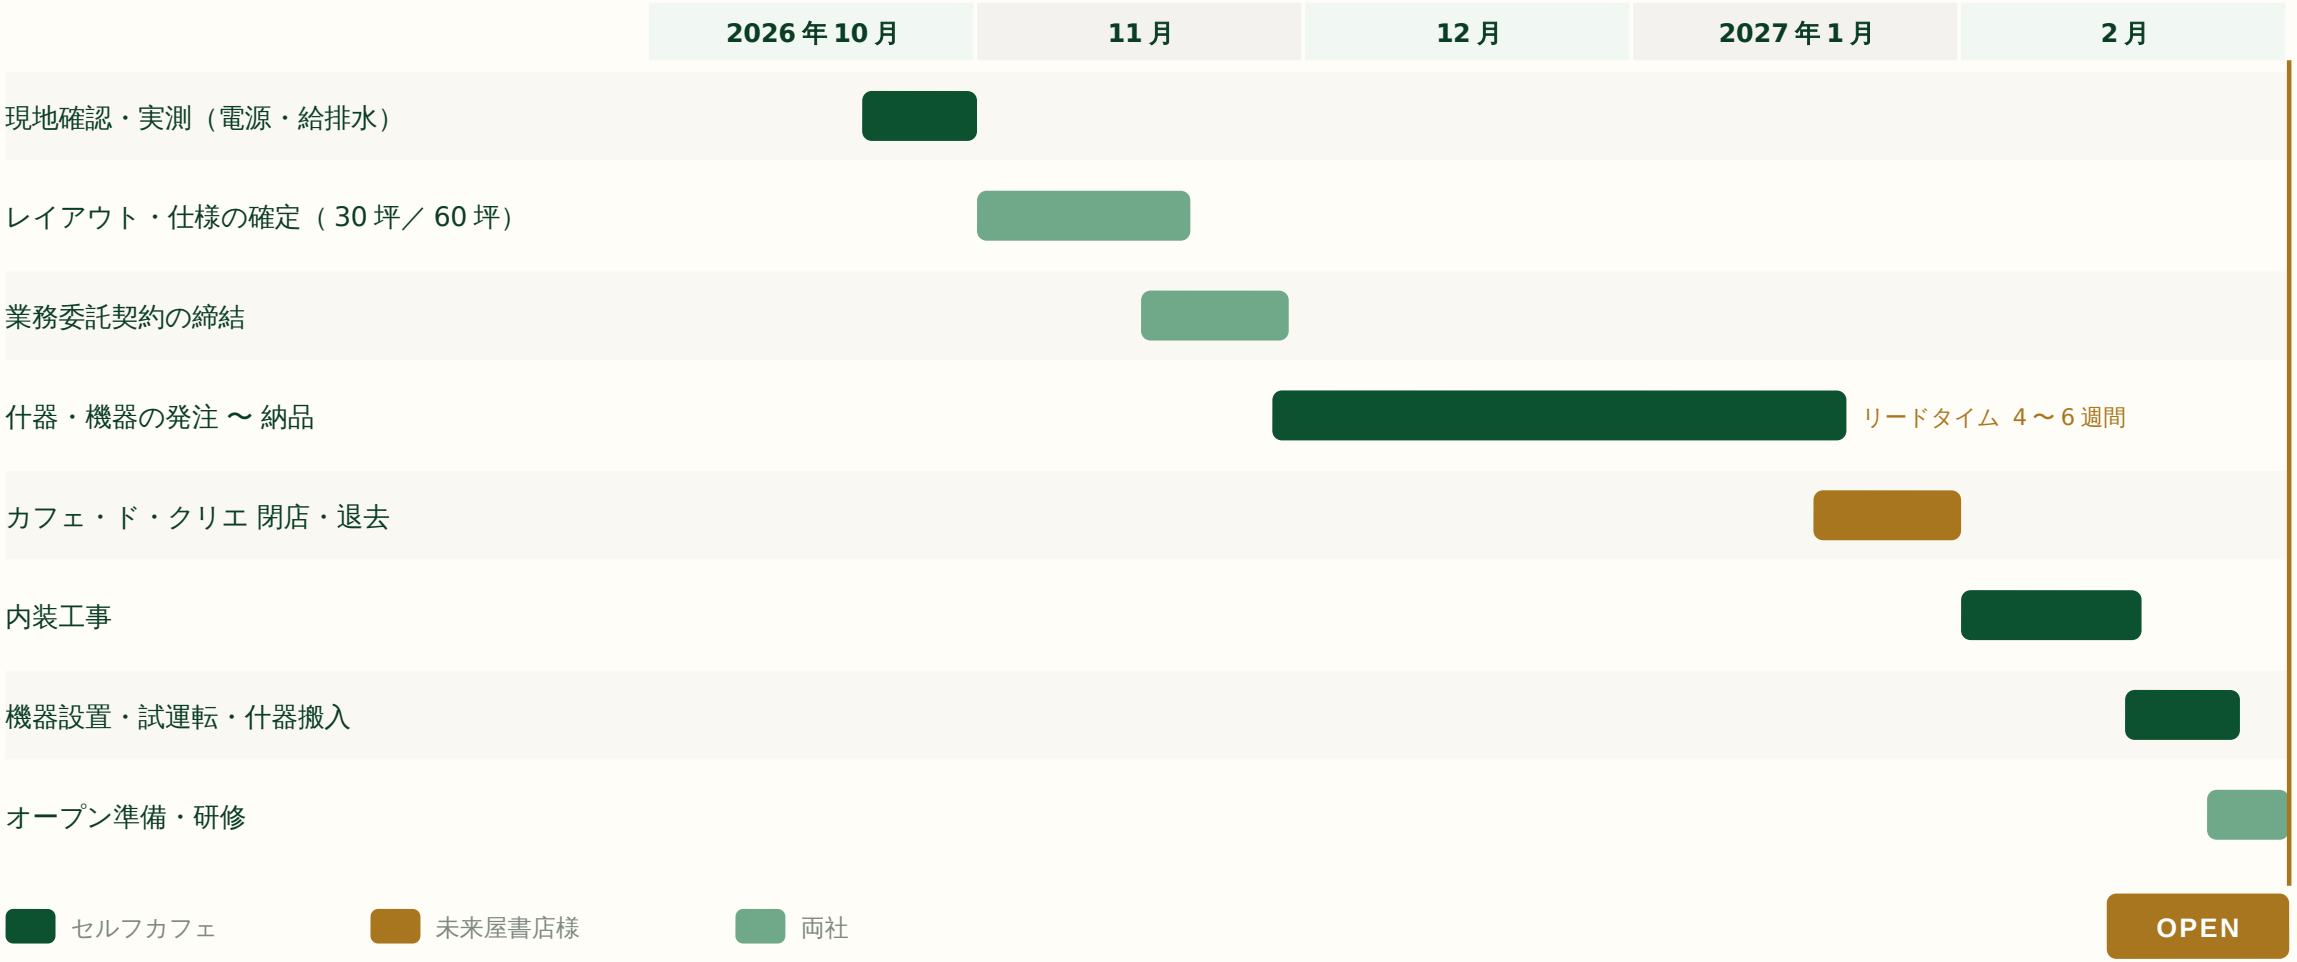

※ 目安の工程です。クリエ様の原状回復範囲、館への工事申請、什器の納期により前後します。

工事は 3 〜 4 週間。ただし発注は先行して必要です。

閉店後に必要な期間と、閉店前から動かしておく必要がある期間を分けて整理しました。

① 閉店後に必要な期間　合計 3 〜 4 週間

3 〜 5 日

残置物の撤去・下地調整

クリエ様の原状回復範囲により変動します

2 〜 3 週間

内装工事（造作・床・サイン）

スタンダード仕様の場合の目安です

3 〜 5 日

機器設置・試運転・什器搬入

電源・給排水が既存で使える前提です

② 閉店前から動かしておく期間　什器・機器の発注リードタイム 4 〜 6 週間

ドリンクマシン・決済端末・什器は受注生産・取り寄せとなるため、発注から納品まで 4 〜 6 週間を要します。
工事は閉店後ですが、この発注だけは閉店前に済ませておく必要があります。発注にはレイアウトと坪数（ 30 坪／ 60 坪）の確定が前提です。

1 月末閉店・ 2 月末オープンは可能です。ただし 12 月上旬までに仕様確定と発注が必要です。

逆算すると、坪数とレイアウトのご決定は 11 月中旬まで、現地確認は 10 月中にお願いできれば確実です。

※ 館（イオンモール様）の工事申請に要する期間は含んでいません。申請期限が判明次第、工程に織り込みます。

先に確定させたい事項を、期限つきで整理しました。

★ 印の 3 点は工期とコストに直結するため、優先してご確認いただけますと助かります。

ご確認事項	内容	ご回答の目安
★ クリエ様の解約条件・閉店日	6 か月前通告の取扱い、違約金の見通し、閉店日の確定	**11 月上旬**
★ 原状回復の範囲	スケルトン戻しか、造作・床・設備を残せるか。工期とコストに最も影響します	**11 月上旬**
★ 残置物・既存設備の扱い	什器・給排水・電気容量・ダクトを引き継げるか。使えれば工期が短縮できます	**11 月上旬**
区画の確定（30 坪／ 60 坪）	レイアウトと什器数量が決まります。発注前の確定が必要です	**11 月中旬**
館への工事申請	イオンモール様の申請様式・提出期限、工事可能時間帯、搬入ルート	11 月中旬
サイン表記の確定	「 MIRAIYA Book & Cafe 」の最終表記と、館の看板規定の確認	11 月中旬
社内稟議の進捗	決裁完了の目処。発注判断の期限と合わせて共有させてください	11 月中旬
運営体制	営業時間、清掃・補充の担当、書店スタッフとの役割分担	12 月上旬

まずは★印の 3 点から。　原状回復の範囲と残置設備の扱いが決まれば、工期と費用の精度が一気に上がります。

※ ご回答の目安は、 2 月末オープンから逆算した日程です。前後する場合は工程をあらためて調整いたします。

ご提供いただきたい資料と、弊社で進めることです。

現地確認までにお手元の資料をご共有いただけますと、設計と見積りを先行して進められます。

ご提供いただきたい資料

- **区画の図面（平面図・展開図）**
  CAD データがあれば実測の手間が省けます
- **電気容量・分電盤の位置**
  増設の要否がこれで判断できます
- **給排水の位置・系統**
  製氷・給湯の可否に関わります
- **現況写真（既存設備・厨房まわり）**
  残置物の判断材料になります
- **館の工事規定・申請様式**
  申請期限から逆算して工程を確定します
- **クリエ様の原状回復条件がわかる資料**
  契約書の該当箇所の抜粋で結構です

弊社で進めること

- **現地確認の日程調整**
  10 月中にお伺いできればと存じます
- **レイアウト図・什器リストの作成**
  30 坪・ 60 坪の両案でご用意します
- **工事費・初期費用のお見積り**
  原状回復の範囲が判明次第お出しします
- **業務委託契約書のドラフト送付**
  11 月上旬を目途にお送りします
- **館への工事申請のサポート**
  図面・仕様書の作成を弊社で行います
- **開業スケジュールの確定版の提示**
  現地確認後に確定版をお送りします

※ すべてが揃っていなくても構いません。お手元にあるものから順次ご共有いただければ、こちらで補いながら進めます。

まずは現地確認の日程をいただけますでしょうか。

現地を拝見できれば、残置設備の活用可否と工期・費用の精度が大きく上がります。

STEP 01

現地確認（10 月中）

区画・電源・給排水・動線と、既存設備の活用可否を確認します。

STEP 02

レイアウト・見積り

30 坪・ 60 坪の両案で図面と費用をお出しします。

STEP 03

区画確定・契約締結

坪数をご決定いただき、業務委託契約を締結します。

STEP 04

発注（12 月上旬）

什器・機器を発注します。
ここが工程上の分岐点です。

STEP 05

工事・オープン

1 月末の閉店後に着工し、2 月末のオープンを目指します。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

TEL　052-879-3557
E-MAIL　info@selfcafe.jp
WEB　https://selfcafe.jp/
